



Cachoeiro de Itapemirim – ES, 21 de Dezembro de 2023.

**Assunto: Análise e Ateste Técnico referente ao pedido de 3ª
medição do 3º aditivo relacionado ao Contrato nº 19/2022**

Empresa: Construtora Menicucci Eirelli

Mateus Rebonato Santos, servidor desta Casa de Leis, nomeado através da Portaria nº 22/2023, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 19/2022 junto a empresa Construtora Menicucci Eirelli, vem relatar o que segue:

Certifico que a empresa citada executou os serviços detalhados na planilha de forma diligente. Após uma revisão cuidadosa, confirmei a aprovação, verificando que os serviços estão em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no projeto.

Com base nesse relato, aprovo o pagamento da 3º Medição do 3º Aditivo referente ao contrato nº 19/2022, no valor de **R\$ R\$ 95.354,36 (Noventa e Cinco mil, Trezentos Cinquenta e Quatro reais e Trinta e Seis e centavos).**"

Segue em anexo fotos dos serviços executados para comprovação do mencionado acima.

Atenciosamente,

**Mateus Rebonato Santos
Engenheiro Civil
CREA ES-0048163/D
Fiscal de Contrato**

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Figura 1 : Instalação ladrilhos



Figura 2 : Concreto Usinado



Figura 3 : Instalação vidros Elevador

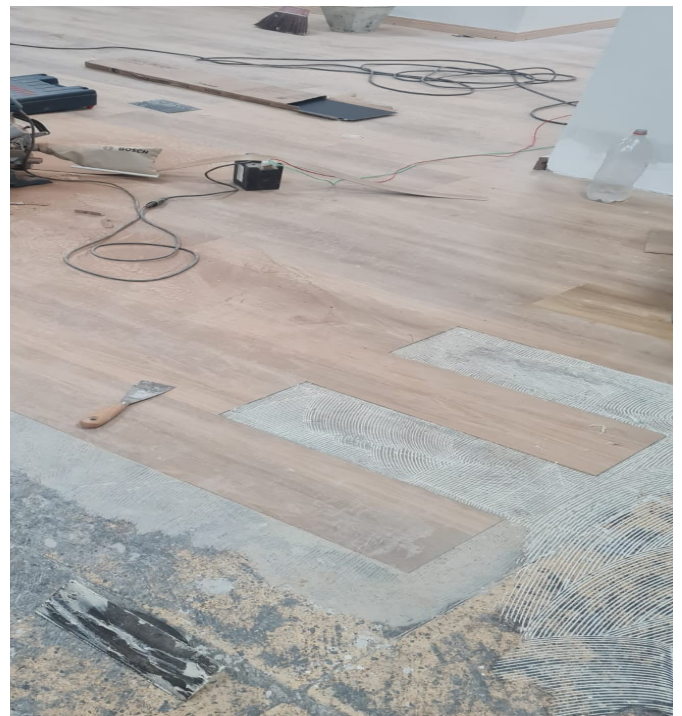


Figura 4: instalação Piso Vinílico

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

OBRA: PROJETO DE REFORMA, ESTACIONAMENTO, INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE EDIFÍCIO-SEDE DA CMCI

3ª MEDIÇÃO

ITEM	ÓRGÃO	CÓD.	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	PREÇOS R\$		Quant.	Valor:
					UNIT. C/ BDI			
1 CALÇADA E ESGOTO PRINCIPAL								
1.3 COLOCAÇÃO DE LADRILHO								
1.3.1	LABOR	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	R\$ 26,36	101,85	R\$ 2.684,77	
1.3.2	LABOR	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de Cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	R\$ 93,98	185,48	R\$ 17.431,41	
2 REFORMA PARTE INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL								
2.2 REVESTIMENTOS								
2.2.2	SINAPI	101727	Piso Vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. AF_09/2020	m²	R\$ 210,80	48	R\$ 10.118,40	
2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E FORRO								
2.3.2	IOPEs	110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	R\$ 58,88	121,36	R\$ 7.145,68	
2.5 LÓGICA E REDE								
2.5.3	SINAPI	98295	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	R\$ 3,47	1500	R\$ 5.205,00	
3 ESCADA EXTERNA GARAGEM E CONTENÇÃO								
3.1	LABOR	40253	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	R\$ 739,42	11,63	R\$ 8.599,45	
3.2	LABOR	40238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	R\$ 99,39	17,1	R\$ 1.699,57	
3.3	LABOR	40333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	R\$ 14,97	123,86	R\$ 1.854,18	
3.4	LABOR	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	R\$ 14,48	100,67	R\$ 1.457,70	
4 ELEVADOR								
4.2	MERCADO		Instalação de vidro temperado, e = 6 mm dobrado, encaixado em perfil.	m²	R\$ 682,26	55,57	R\$ 37.913,19	
4.4	LABOR	30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	R\$ 80,95	15,38	R\$ 1.245,01	
							TOTAL:	R\$ 95.354,36
